

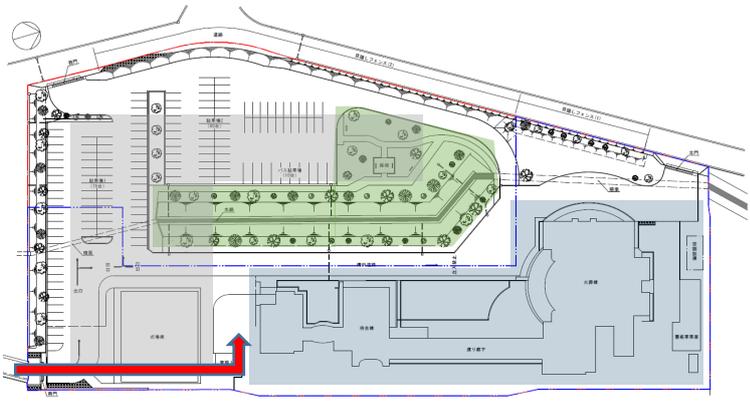
## 7. スクラップ&ビルド計画検討

### 7.1. 建設計画案の作成

火葬については継続したまま建替えを行う必要があるため、火葬に関する機能は残したままとする。式場棟については、使用頻度が低いため建設に伴い、早期に解体するものとする。

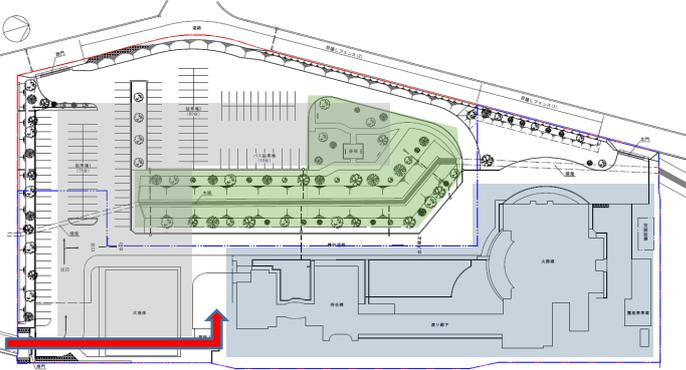
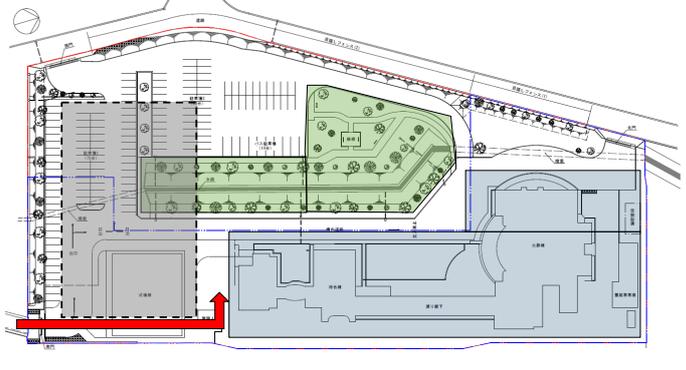
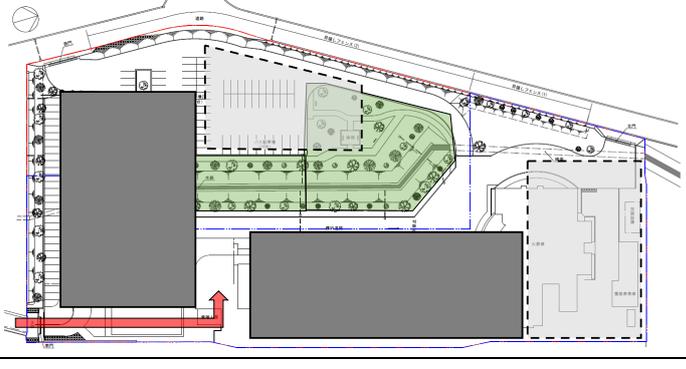
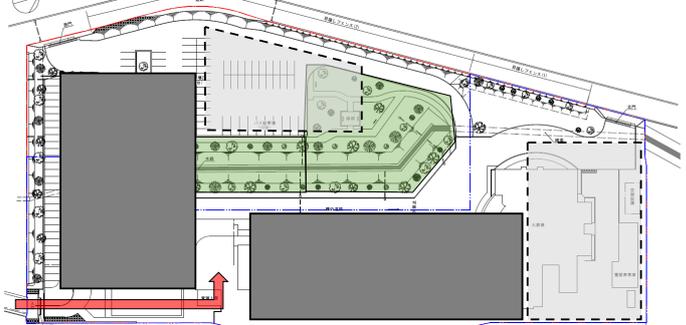
この場合、以下のケースが想定される。

表 7-1 想定される建築計画案の概要

概念図		概要	
式場棟のみ解体し、建て直す案			
式場棟	待合棟	火葬棟	備考
解体	継続利用	継続利用	仮設建設物は無
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○火葬棟及び待合棟の稼働</li> <li>○現在の緑地の保全</li> <li>○式場棟の解体（建設期間については、民間施設等により対応）</li> <li>○南側入口の優先（環境への配慮）</li> </ul>	

計画案の概要を以下に示す。

表 7-2 建設プロセス概要

	概念図	概要
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>・火葬棟及び待合棟の稼働</li> <li>・できるだけ、現在の緑地を残す</li> <li>・式場棟は、建設期間については、代替案により対応。</li> <li>・南側入口の優先（環境影響の低減等）</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>○建設可能範囲の限定</p>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>・火葬棟及び待合棟の稼働継続</li> <li>・現式場棟の解体、跡地への新火葬棟建設</li> <li>・南側入口の優先</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>○現式場棟の解体 → 火葬棟の建設</p>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>・新火葬棟の完成、稼働</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>○現火葬棟の解体 → 式場棟の建設</p>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>・新火葬棟、式場棟の完成、供用</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>○駐車場等、外構整備</p>
