

特記仕様書

- 1 総則 この特記仕様書は地域防災課が使用する防災用備蓄倉庫の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
- 2 件名 防災用備蓄倉庫の購入
- 3 納入期限 令和3年6月30日（水）
- 4 担当課 危機管理室 地域防災課
- 5 納入場所 中山小学校 ほか11か所
【納入場所一覧】
- | | |
|---------|----------------------|
| ①中山小学校 | 住所：市川市中山1丁目1番5号 |
| ②大柏小学校 | 住所：市川市大野町2丁目1877番地 |
| ③若宮小学校 | 住所：市川市若宮3丁目54番10号 |
| ④平田小学校 | 住所：市川市平田3丁目28番1号 |
| ⑤鬼高小学校 | 住所：市川市鬼高2丁目13番5号 |
| ⑥中国分小学校 | 住所：市川市中国分1丁目22番1号 |
| ⑦曾谷小学校 | 住所：市川市曾谷7丁目18番1号 |
| ⑧柏井小学校 | 住所：市川市柏井町1丁目1149番地の1 |
| ⑨塩焼小学校 | 住所：市川市塩焼5丁目9番8号 |
| ⑩第六中学校 | 住所：市川市鬼高3丁目16番1号 |
| ⑪東国分中学校 | 住所：市川市東国分3丁目5番1号 |
| ⑫南新浜小学校 | 住所：市川市新浜1丁目26番1号 |
- ・詳細は別紙「納入場所地図」を参照のこと。
 - ・現場の確認が必要な場合は、担当課及び学校に事前に連絡すること。
- 6 数量 12棟
※「5 納入場所」における納入場所内訳①～⑫に各1棟ずつ納入することとする。

7 規格

①～⑪の11カ所は、以下の同等品2種から1種類を選択して納入すること。

メーカー	株式会社稲葉製作所	株式会社淀川製鋼所
型番	NXP-98HT (一般型)	DZB-3625HE (一般型)
外寸(mm)	W4,420×D2,210×H2,375	W3,636×D2,584.5×H2,468
開口部	別売壁面扉 SP-4H (H2,025mm)を追加し、 開口部を2か所にすること	開口部1か所
棚板	別売棚Aセットを配置	別売大型棚を設置 大型棚セットDZ2.5型 (壁2.5枚用)
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・物置の運搬及び組み立てを行い、1棟につき必要数分の基礎ブロックの打設及び付属アンカープレートの取付等の転倒防止処理を行うこと。 ・壁面扉、棚板等、別売の付属品に関しては、配置等の詳細について落札後に受注者が担当課へ確認すること。 ・25cm角で「防災倉庫」と名入れをすること ・床にパネコート (12mm) を敷き、ビス止めを行い固定すること ・鍵は本体付属2本に加え、スペアキー1本を追加し、合計3本とすること 	

⑫南新浜小学校は、以下の同等品2種から1種類を選択して納入すること。

メーカー	株式会社稲葉製作所	株式会社淀川製鋼所
型番	NXP-40HT (一般型)	DZB-2215HE (一般型)
外寸(mm)	W2,210×D1,790×H2,375	W2,234×D1,533×H2,473
開口部	開口部1か所	開口部1か所
棚板		別売大型棚を設置 大型棚セットDZ2.0型 (壁2枚用)
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・物置の運搬及び組み立てを行い、1棟につき必要数分の基礎ブロックの打設及び付属アンカープレートの取付等の転倒防止処理を行うこと。 ・壁面扉、棚板等、別売の付属品に関しては、配置等の詳細について落札後に受注者が担当課へ確認すること。 ・床にパネコート (12mm) を敷き、ビス止めを行い固定すること ・鍵は本体付属2本に加え、スペアキー3本を追加し、合計5本とすること 	

8 納入について

- ・納入に使用する車両及び納入の日時については、事前に担当課と協議すること。
- ・納入する時間は、午前9時から午後4時までの間とする。
- ・納入の際は、児童・職員等の安全性を十分確保し、事故防止に努めること。
- ・納入の際に生じたごみは持ち帰ること。

9 検収について

- ・納品に際しては担当課担当者及び契約課担当者の検収を受けるものとする。


10 その他

- ・価格には、搬入・組立及び転倒防止処理の費用を含めること。
- ・納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがあるてはならない。
- ・その他不明な点は、担当課担当者及び契約課担当者へ連絡し指示を受けること。
- ・暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
- ・この特記仕様書に定めのない事項について、物品供給契約書 (物品供給契約約款を含む) に定めるとおりとする。

別紙「納入場所位置図」

設置場所	大柏小学校	地面下地	土	傾斜	やや有り
------	-------	------	---	----	------

設置所定場所（位置図）

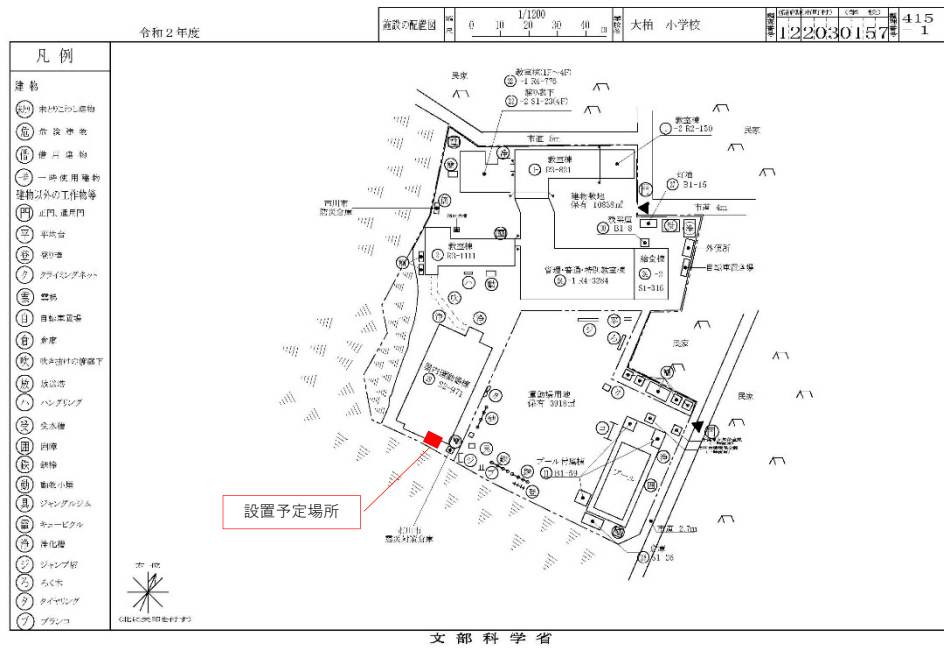


設置予定場所（写真）



別紙「納入場所位置図」

設置場所	若宮小学校	地面下地	土	傾斜	やや有り
------	-------	------	---	----	------

設置所定場所（位置図）

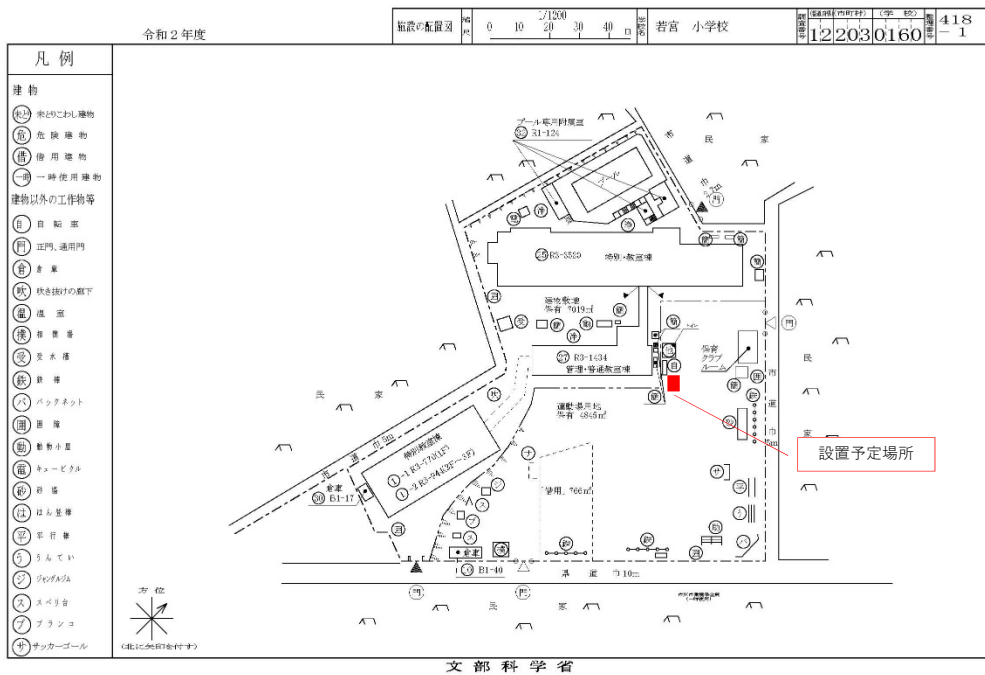


設置予定場所（写真）



別紙「納入場所位置図」

設置場所	鬼高小学校	地面下地	土	傾斜	無
------	-------	------	---	----	---

設置所定場所（位置図）

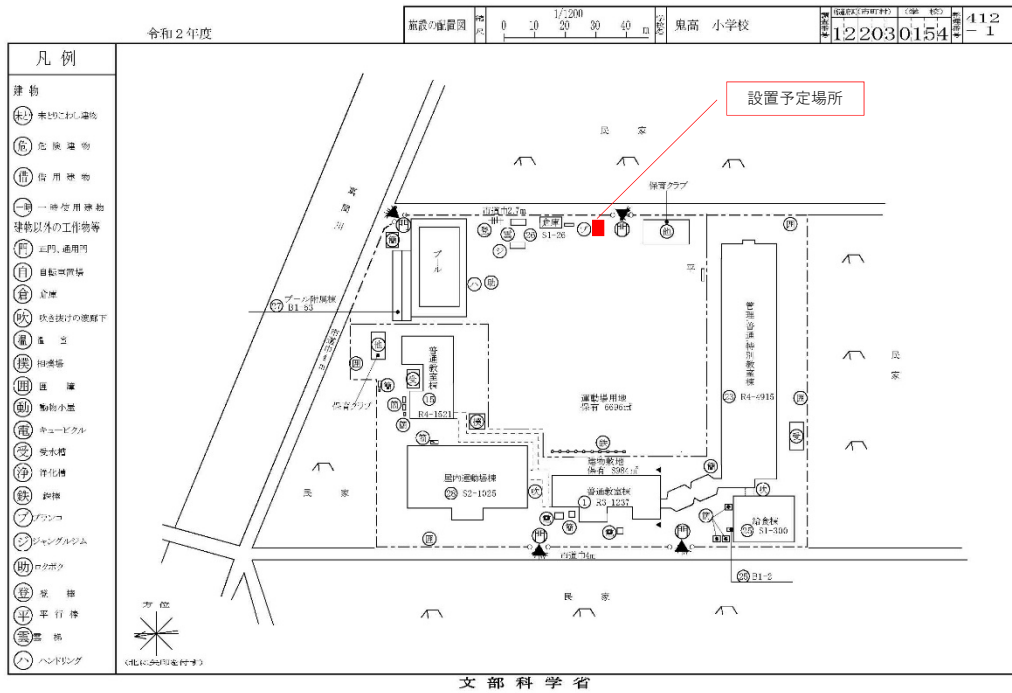


設置予定場所（写真）



別紙「納入場所位置図」

設置場所	中国分小学校	地面下地	土	傾斜	やや有
------	--------	------	---	----	-----

設置所定場所（位置図）

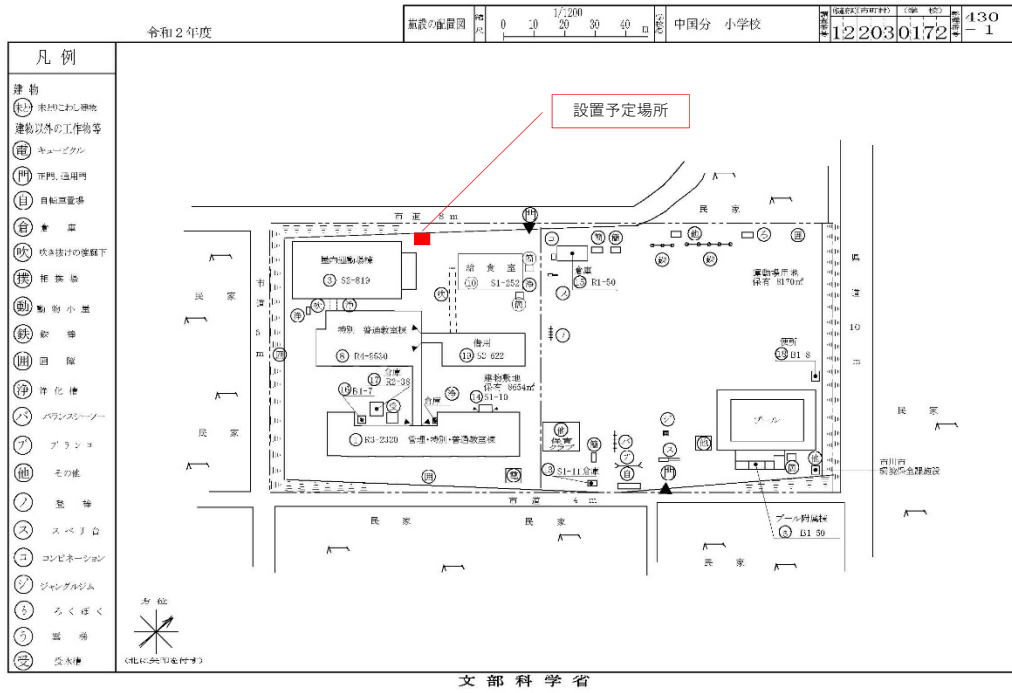


設置予定場所（写真）



別紙「納入場所位置図」

設置場所	柏井小学校	地面下地	土	傾斜	やや有
------	-------	------	---	----	-----

設置所定場所（位置図）

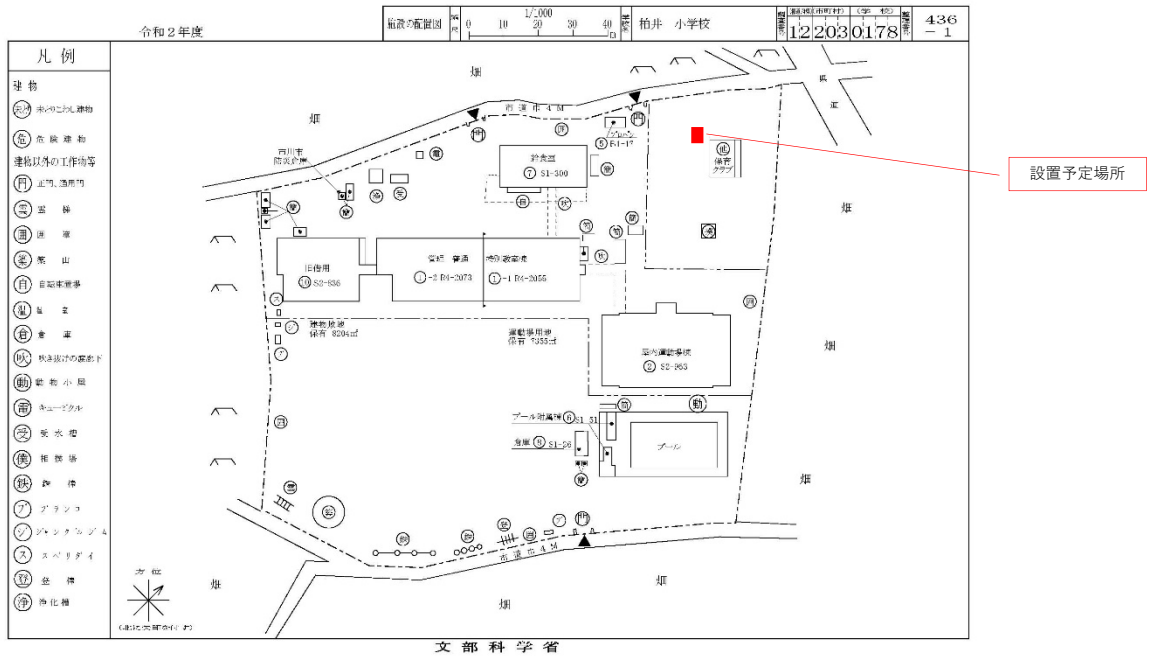


設置予定場所（写真）



別紙「納入場所位置図」

設置場所	塩焼小学校	地面下地	コンクリート	傾斜	無
------	-------	------	--------	----	---

設置所定場所（位置図）

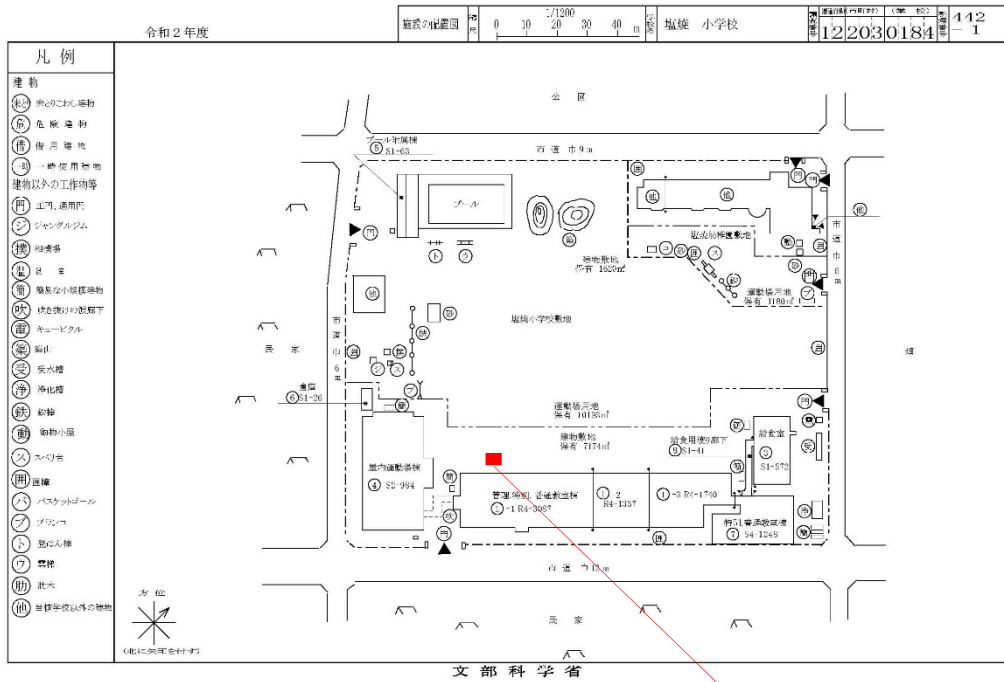

設置予定場所


設置予定場所（写真）



別紙「納入場所位置図」

設置場所	第六中学校	地面下地	土	傾斜	無
------	-------	------	---	----	---

設置所定場所（位置図）

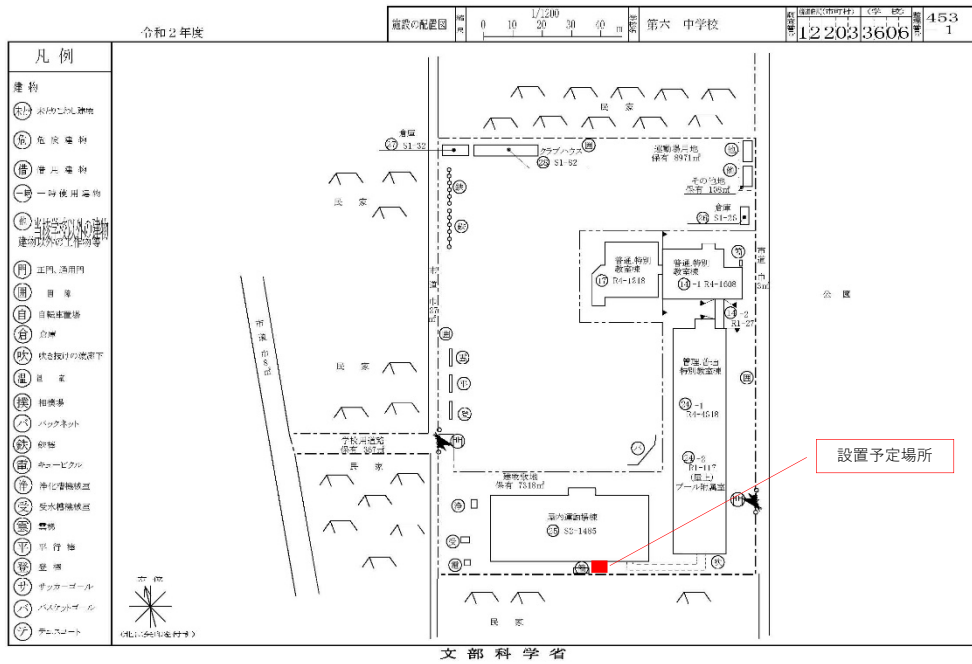


設置予定場所（写真）



別紙「納入場所位置図」

設置場所	東国分中学校	地面下地	土	傾斜	無
------	--------	------	---	----	---

設置所定場所（位置図）

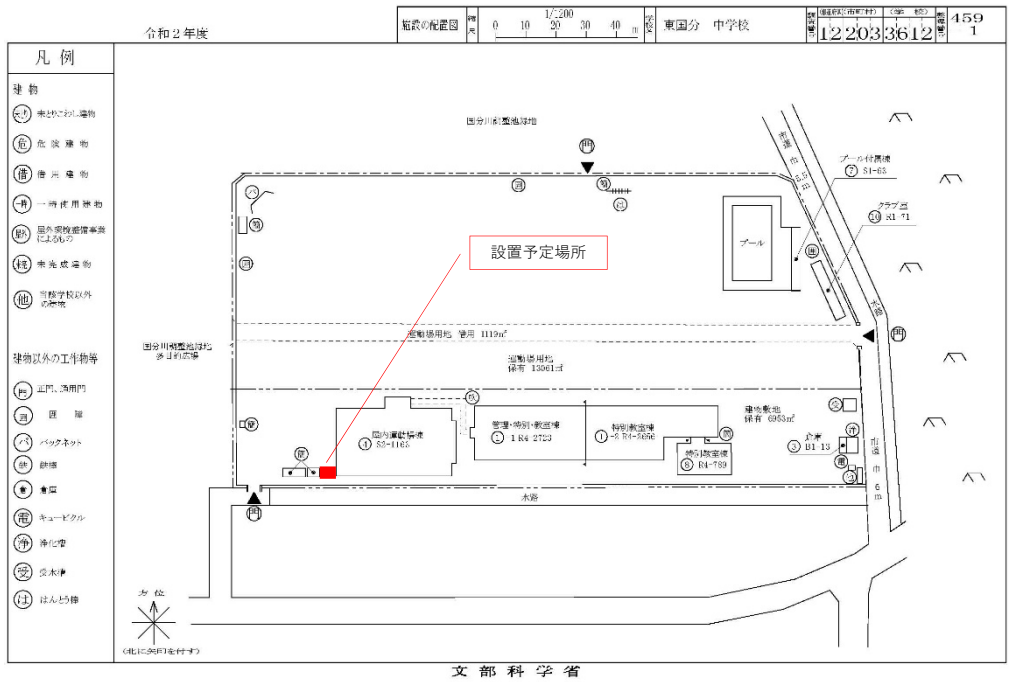


設置予定場所（写真）



別紙「納入場所位置図」

設置場所	南新浜小学校	地面下地	土	傾斜	無
------	--------	------	---	----	---

設置所定場所（位置図）

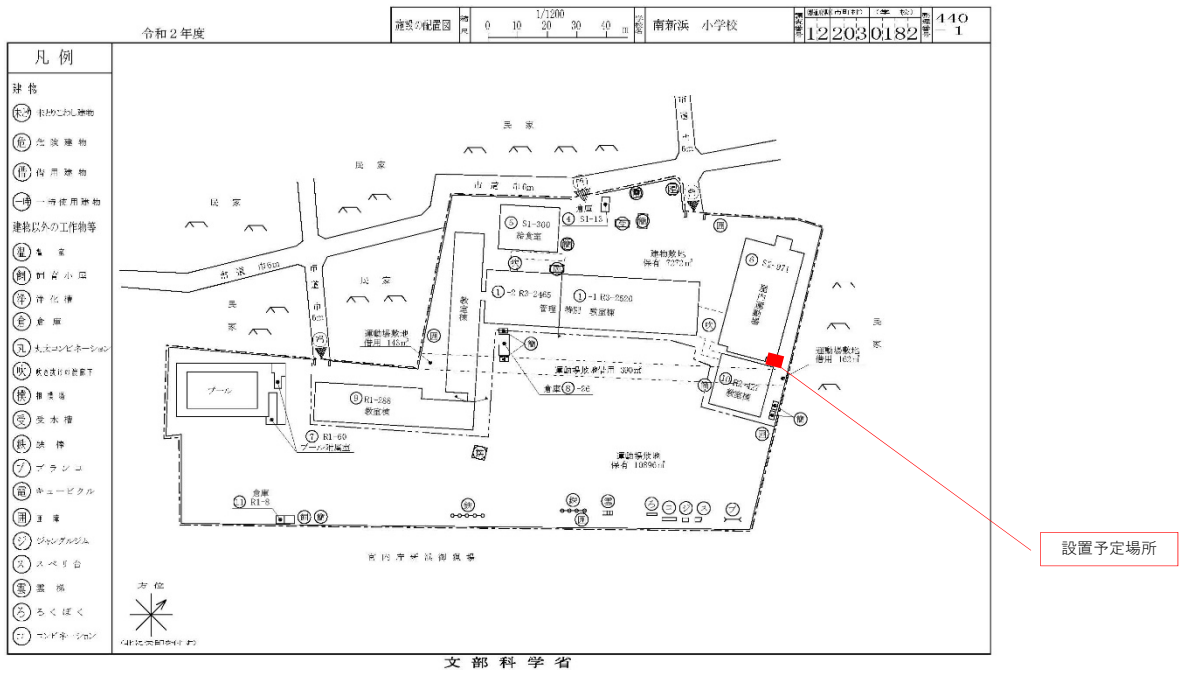

設置予定場所（写真）

