

## 特記仕様書

- 1 総則 この特記仕様書は地域防災課が使用する防災用備蓄倉庫の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
- 2 件名 防災用備蓄倉庫の購入
- 3 納入期限 令和5年3月31日（金）
- 4 担当課 危機管理室 地域防災課
- 5 納入場所 いきいきセンター北方 ほか6か所  
【納入場所一覧】  
①いきいきセンター北方 北方2丁目29番地の19  
②第五中学校 大野町3丁目1993番地  
③南行徳公民館 相之川1丁目3番地の7  
④福栄小学校 南行徳2丁目2番地の1  
⑤行徳小学校 富浜1丁目1番地の40  
⑥国分小学校 東国分2丁目4番地の1  
⑦市民プール 北方町4丁目2270番地3  
・詳細は別紙「納入場所地図」を参照のこと。  
・現場の確認が必要な場合は、担当課及び学校に事前に連絡すること。
- 6 数量 8棟  
※「5 納入場所」における納入場所内訳①～⑧に各1棟ずつ納入し、  
⑦については2棟納入すること。
- 7 規格 ※メーカーは株式会社稲葉製作所もしくは株式会社淀川製鋼所より選定すること。  
なお、⑦については納入する2棟のメーカーを統一すること。  
※サイズはいずれも屋根張り出し部分を含まない外寸とする。

納入場所	①いきいきセンター北方	
メーカー	株式会社稲葉製作所	株式会社淀川製鋼所
参考製品型番	SMK-58SN	DZB-2918HW
※横幅(mm)	2,900以上3,100以下	
※奥行(mm)	1,800以上1,900以下	
※高さ(mm)	2,200以上2,500以下	
開口部	開口部1か所	
棚板	棚板2段以上設置のこと	
※棚板参考	棚板・棚支柱セット KC×1、65×1、67×1	大型棚セットDZ2.5型
断熱	ウレタン等を使用した断熱性能タイプの仕様のもの	
備考		

納入場所	②第5中学校 ③南行徳公民館	
メーカー	株式会社稲葉製作所	株式会社淀川製鋼所
参考製品型番	SMK - 68HN	DZB - 3618HW
※横幅(mm)	3,600以上3,700以下	
※奥行(mm)	1,800以上1,900以下	
※高さ(mm)	2,200以上2,500以下	
開口部	開口部1か所	
棚板	棚板2段以上設置のこと	
※棚板参考	棚板・棚支柱セット KB×1、KH×1、66×2、68×1	大型棚セットDZ2.5型
断熱	ウレタン等を使用した断熱性能タイプの仕様のもの	
備考	・④については設置場所が傾斜となっているため整地作業を施すこと。	

納入場所	④福栄小学校 ⑤行徳小学校 ⑥国分小学校	
メーカー	株式会社稲葉製作所	株式会社淀川製鋼所
参考製品型番	SMK-61SN	DZB-2522HW
※横幅(mm)	2,400以上2,600以下	
※奥行(mm)	2,200以上2,600以下	
※高さ(mm)	2,200以上2,500以下	
開口部	開口部1か所	
棚板	棚板2段以上設置のこと	
※棚板参考	棚板・棚支柱セット KB×1、65×1、67×1	大型棚セットDZ2.5型
断熱	ウレタン等を使用した断熱性能タイプの仕様のもの	
備考		

納入場所	⑦市民プール（2棟）	
メーカー	株式会社稲葉製作所	株式会社淀川製鋼所
参考製品型番	SMK-90HN	DZB-3622HW
※横幅(mm)	3,600以上3,700以下	
※奥行(mm)	2,200以上2,500以下	
※高さ(mm)	2,200以上2,500以下	
開口部	開口部1か所	
棚板	棚板2段以上設置のこと	
※棚板参考	棚板・棚支柱セット KB×1、KH×1、66×2、68×1	大型棚セットDZ2.5型
断熱	ウレタン等を使用した断熱性能タイプの仕様のもの	
備考	・2棟並列で設置すること。	

- 8 納入について
- ・物置の運搬及び組み立てを行い、1棟につき必要数分の基礎ブロックの打設及び付属アンカープレートの取付等の転倒防止処理を行うこと。
  - ・壁面扉、棚板等、別売の付属品に関しては、配置等の詳細について落札後に受注者が担当課へ確認すること。
  - ・25cm角で「防災倉庫」と名入れをすること。  
なお、名入れの位置、色、字体については落札後、担当課の指示に従うこと。
  - ・床にパネコート（12mm）を敷き、ビス止めを行い固定すること。
  - ・鍵は1棟につき合計3本納入すること。
  - ・納入に使用する車両及び納入の日時については、事前に担当課と協議すること。
  - ・納入する時間は、土曜日、日曜日および祝日を除く平日の午前9時から午後4時までの間とする。
  - ・納入の際は、児童・職員等の安全性を十分確保し、事故防止に努めること。
  - ・納入の際に生じたごみは持ち帰ること。
- 9 検収について
- ・納品に際しては担当課担当者及び契約課担当者の検収を受けるものとする。
- 10 その他
- ・納入する製品を選定し、入札時に内訳書により指定すること。
  - ・契約金額には、搬入・組立及び転倒防止処理の費用を含めること。
  - ・納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがない。
  - ・その他不明な点は、担当課担当者及び契約課担当者へ連絡し指示を受けること。
  - ・暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
  - ・この特記仕様書に定めのない事項について、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。

## 別紙「納入場所地図」

設置場所	いきいきセンター北方	地面下地	土	傾斜	無
------	------------	------	---	----	---

## 設置予定場所（位置図）




## 設置予定場所（写真）



# 別紙「納入場所地図」

設置場所	第5中学校	地面下地	土	傾斜	有 (要整地)
------	-------	------	---	----	------------

## 設置予定場所（位置図）

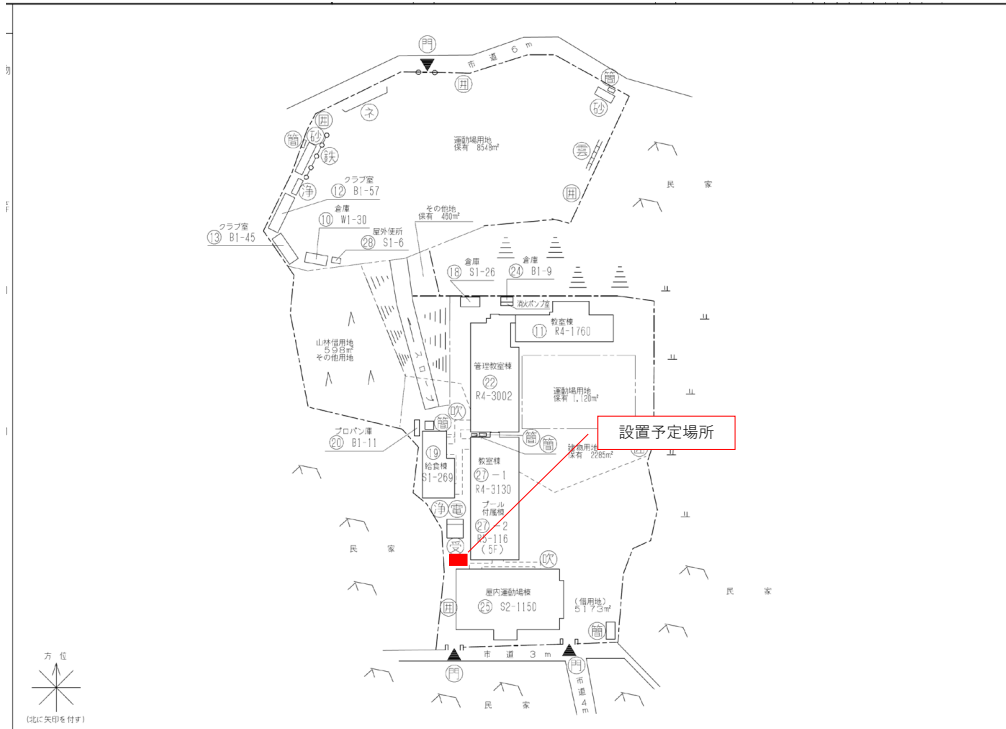

## 設置予定場所（写真）



## 別紙「納入場所地図」

設置場所	南行徳公民館	地面下地	土	傾斜	無
------	--------	------	---	----	---

## 設置予定場所（位置図）




## 設置予定場所（写真）



# 別紙「納入場所地図」

設置場所	福栄小学校	地面下地	土、コンクリート	傾斜	やや有り
------	-------	------	----------	----	------

## 設置予定場所（位置図）

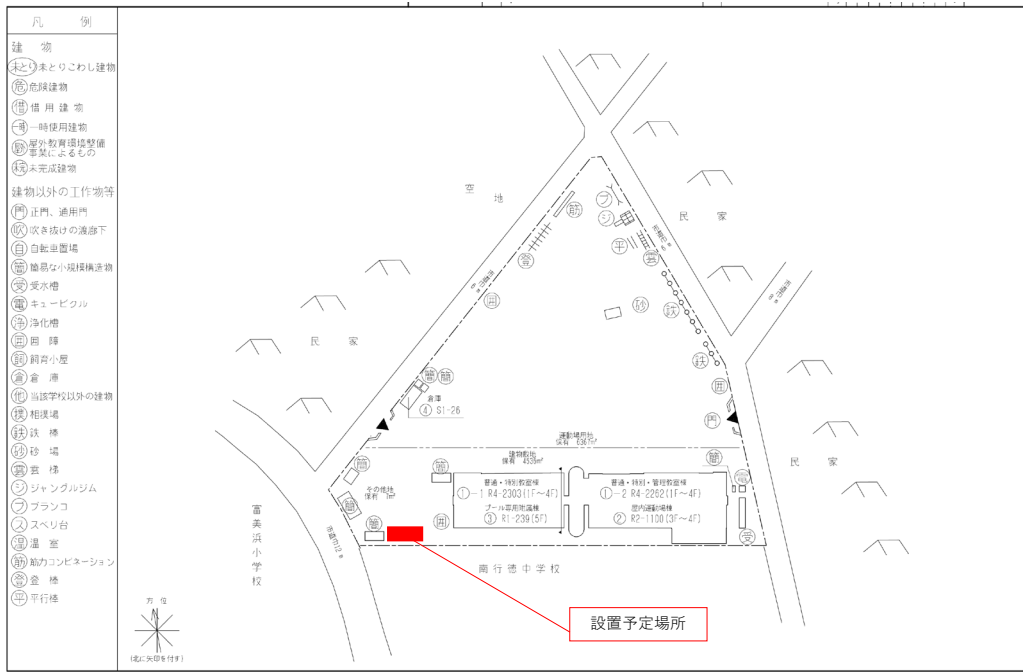


## 設置予定場所（写真）



# 別紙「納入場所地図」

設置場所	行徳小学校	地面下地	土	傾斜	無
------	-------	------	---	----	---

## 設置予定場所（位置図）

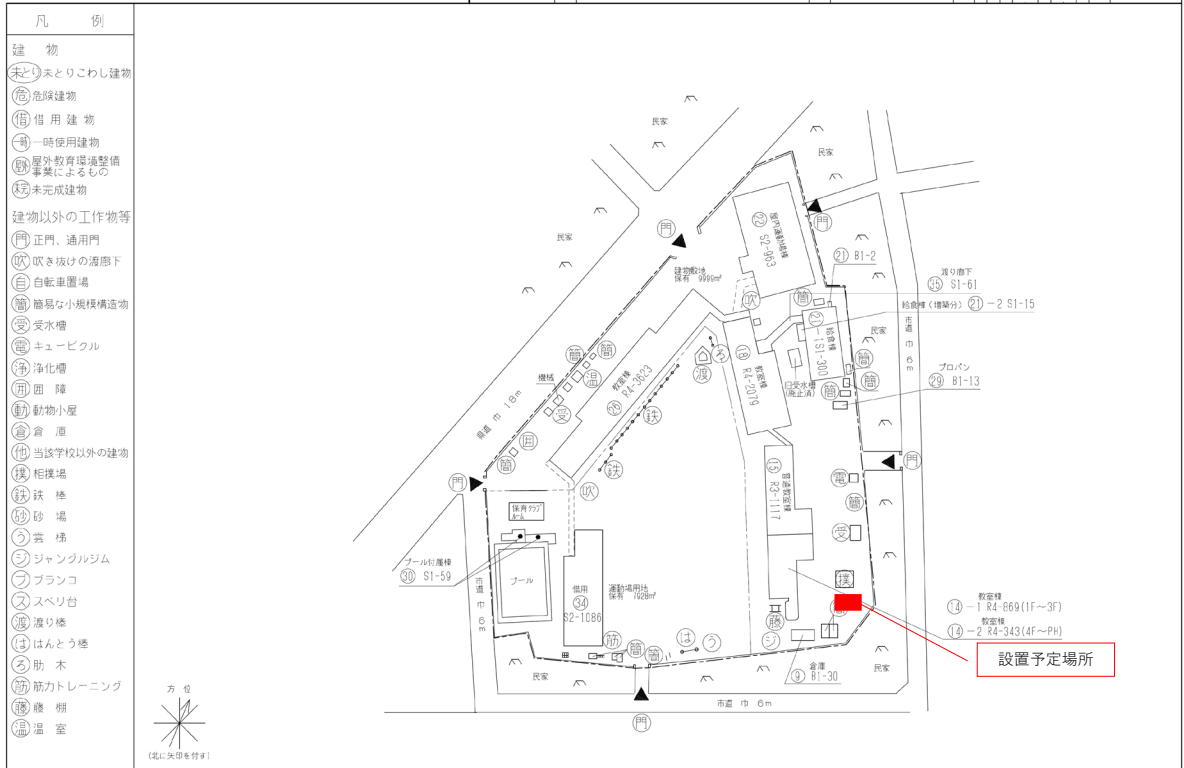

## 設置予定場所（写真）






# 別紙「納入場所地図」

設置場所	国分小学校	地面下地	土	傾斜	無
------	-------	------	---	----	---

## 設置予定場所（位置図）

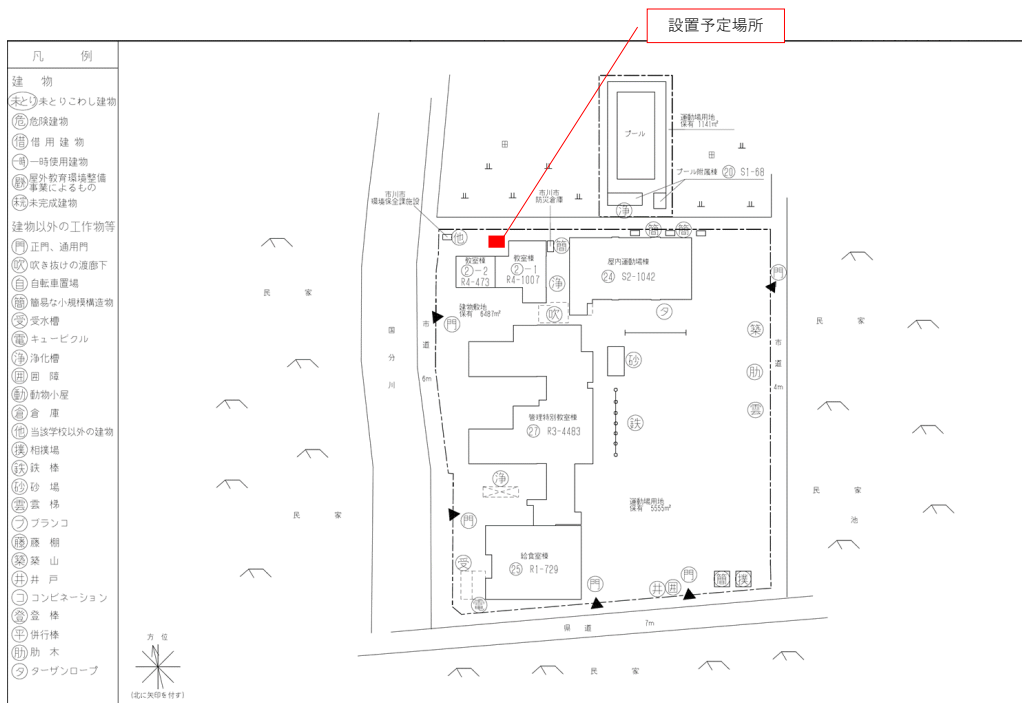

## 設置予定場所（写真）



## 別紙「納入場所地図」

設置場所	市民プール	地面下地	土	傾斜	やや有
------	-------	------	---	----	-----

## 設置予定場所（位置図）



## 設置予定場所（写真）

