

市川市 道路附属物（横断歩道橋） 長寿命化修繕計画

【令和4年度策定】



令和5年3月

 市 川 市

(令和8年4月一部改訂)

目 次

1. 長寿命化修繕計画の策定について	1
1) これまでの取り組み	1
2) 計画策定の背景	1
3) 計画策定の概要	1
2. 長寿命化修繕計画の目的	2
1) 現 状	2
2) 目 的	2
3. 長寿命化修繕計画の対象横断歩道橋	3
4. 長寿命化修繕計画策定のフロー	6
5. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針	7
1) 健全度の把握に関する基本的な方針	7
2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針	7
3) 横断歩道橋の健全度	8
6. 横断歩道橋の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の 縮減に関する基本的な方針	10
7. 横断歩道橋ごとの概ねの次回点検時期及び 修繕内容・時期又は架替え時期	11
1) 点検時期	11
2) 横断歩道橋の修繕内容及び時期	11
8. 長寿命化修繕計画による効果	12
9. 今後の取り組み	13
1) 新技術等の活用方針	13
2) 費用縮減効果に関する具体的な方針	13
10. 計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者	14

1. 長寿命化修繕計画の策定について

1) これまでの取り組み

市川市では、市が管理する全ての横断歩道橋の継続的な安全性と信頼性を確保できるよう、平成 25 年 3 月に「市川市 橋りょう長寿命化修繕計画」（以下、「修繕計画」という。）を策定しました。平成 30 年 3 月には修繕計画の見直しを行い、更に計画的な修繕を進めるなど、予防保全型による維持管理に取り組んできました。

維持管理の基本となる横断歩道橋定期点検は、平成 23 年度から 5 年に 1 度の頻度で実施しています。

これまでの計画では、市が管理する 123 橋について長寿命化修繕計画を策定し、予防保全型による維持管理に取り組んでいましたが、本計画から、対象橋りょう 123 橋のうち、横断歩道橋 5 橋を対象に、道路附属物（横断歩道橋）として長寿命化修繕計画を策定しました。

平成 26 年度から現時点（令和 5 年 3 月時点）までに補修工事を行った道路附属物（横断歩道橋）は 2 橋（平成 29 年度から現在では 1 橋）です。今後も計画的に対策を実施していく予定です。

2) 計画策定の背景

平成 26 年 3 月に道路法施行規則において、道路の維持・修繕に関する省令・告示が公布され、5 年に 1 回の定期点検の実施と近接目視による点検方法が規定されました。また、平成 26 年 6 月に「道路橋定期点検要領（国土交通省 道路局）」が策定され、橋りょう等の健全度を把握するための方法（点検方法や健全度評価指標）が改めて示されました。

前回計画の更新（平成 29 年度更新）から 5 年が経過し、近接目視による新たな点検結果及び修繕実績による知見が蓄積されたことを踏まえ、今回、横断歩道橋長寿命化修繕計画を改訂する運びとなりました。

現在の道路橋示方書では、設計供用期間は 100 年が標準とされていますが、既設橋は修繕して使い続けることで 100 年を目指し架替えに掛かる費用の抑制を目的とします。

3) 計画策定の概要

計画策定の主な内容は以下のとおりです。

- 「鬼越歩道橋（田尻 1 丁目）」、「鬼高歩道橋（田尻 3 丁目）」、「二俣歩道橋」、「塩浜歩道橋」、「原木・二俣歩道橋」の 5 橋は、道路橋に含んで計画を策定していましたが、横断歩道橋であるため、新たに道路付属物（横断歩道橋）として修繕計画を策定することになりました。
- 令和 4 年度までに実施した定期点検結果を踏まえて健全度の把握を行い、計画に反映しました。
- 計画の開始年を令和 6 年度（2024 年）からとしました。
- 前回計画策定以降に実施した補修工事等の実績を計画に反映しました。
- 市川駅南口ペDESTリアンデッキを追加しました。

2. 長寿命化修繕計画の目的

1) 現 状

市川市が管理する道路附属物（横断歩道橋）は、6 橋あります。橋下の状況は高速道路（京葉道路）を跨ぐ横断歩道橋が 3 橋、市道を跨ぐ横断歩道橋が 3 橋です。

横断歩道橋の老朽化の目安となる建設後 50 年以上経過する横断歩道橋は、2023 年時点で 1 橋あり、今後 20 年後には 2 橋になります。

今後、老朽化が進んでいく横断歩道橋が増加するため、修繕や架替えにかかる費用の増大が見込まれます。そのため、計画的かつ予防的な対応をすることで予算の平準化と維持管理費の縮減を図っていく必要があります。

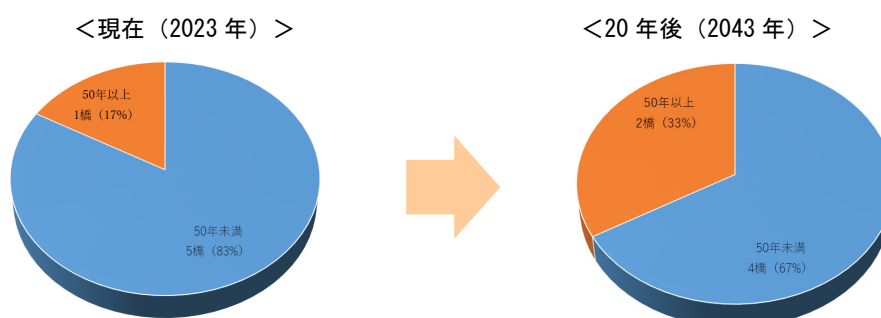


図 2.1 建設後 50 年を超える横断歩道橋数の推移



写真 2.1 建設後 50 年を経過する横断歩道橋

2) 目 的

計画的かつ予防的な対応（予防保全型管理）を推進し、これらに係る維持管理費用の縮減や予算の平準化を図るため、「前回計画」を改訂し、市が管理する全ての横断歩道橋の継続的な安全性と信頼性を確保することを目的とします。

また、耐震化等必要な対策を修繕工事に併せて実施することにより、大規模地震が発生した場合でも、落橋を防止できる耐震性能を確保します。

3. 長寿命化修繕計画の対象横断歩道橋

本計画では、市が管理している6橋を対象とします。


表 3.1 長寿命化修繕計画の対象横断歩道橋数

橋 長	橋下状況		合計
	高速道路	市道	
5m 未満	0	0	0
5m 以上 15m 未満	0	0	0
15m 以上 30m 未満	0	1	1
30m 以上 50m 未満	2	1	3
50m 以上	1	1	2
全 体	3	3	6

【管理横断歩道橋の概要】

- 橋長は、15m 以上 30m 未満が1橋、30m 以上 50m 未満が3橋、50m 以上が2橋です。
- 供用年数は、架設後50年を超える横断歩道橋が1橋、30年以上50年未満が1橋、10年以上30年未満が2橋、10年未満が2橋です。
- 橋下条件は、高速道路（京葉道路）を跨ぐ横断歩道橋が3橋、市道を跨ぐ横断歩道橋が3橋あります。

道路附属物（横断歩道橋）長寿命化修繕計画策定業務委託
 対象横断歩道橋 6橋

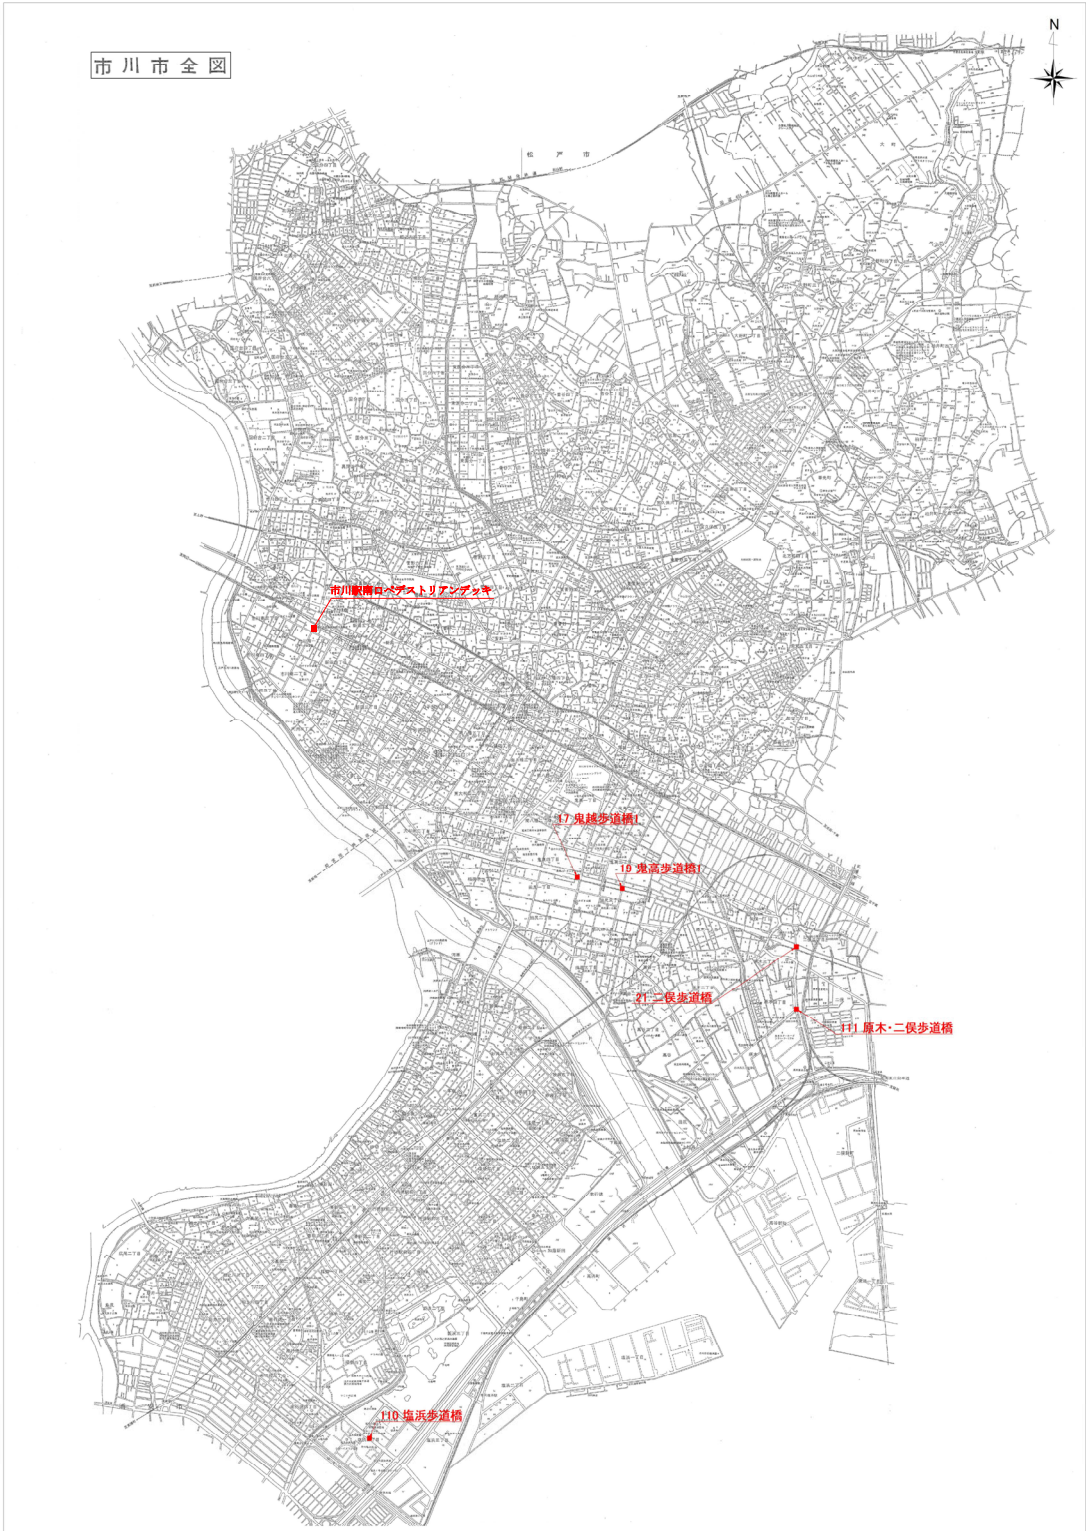

【凡例】
 ● コンクリート橋
 ■ 鋼橋

図 3.1 対象横断歩道橋位置図

【計画対象横断歩道橋の代表例（横断歩道橋形式別）】

鋼橋：110_塩浜歩道橋（単純中路式鋼板桁橋、橋長 26.8m、市道 0101 号線）



鋼橋：111_原木・二俣歩道橋（単純鋼箱桁橋、橋長 35.6m、市道 0116 号線）



4. 長寿命化修繕計画策定のフロー

長寿命化修繕計画は、以下のフローに従い策定します。

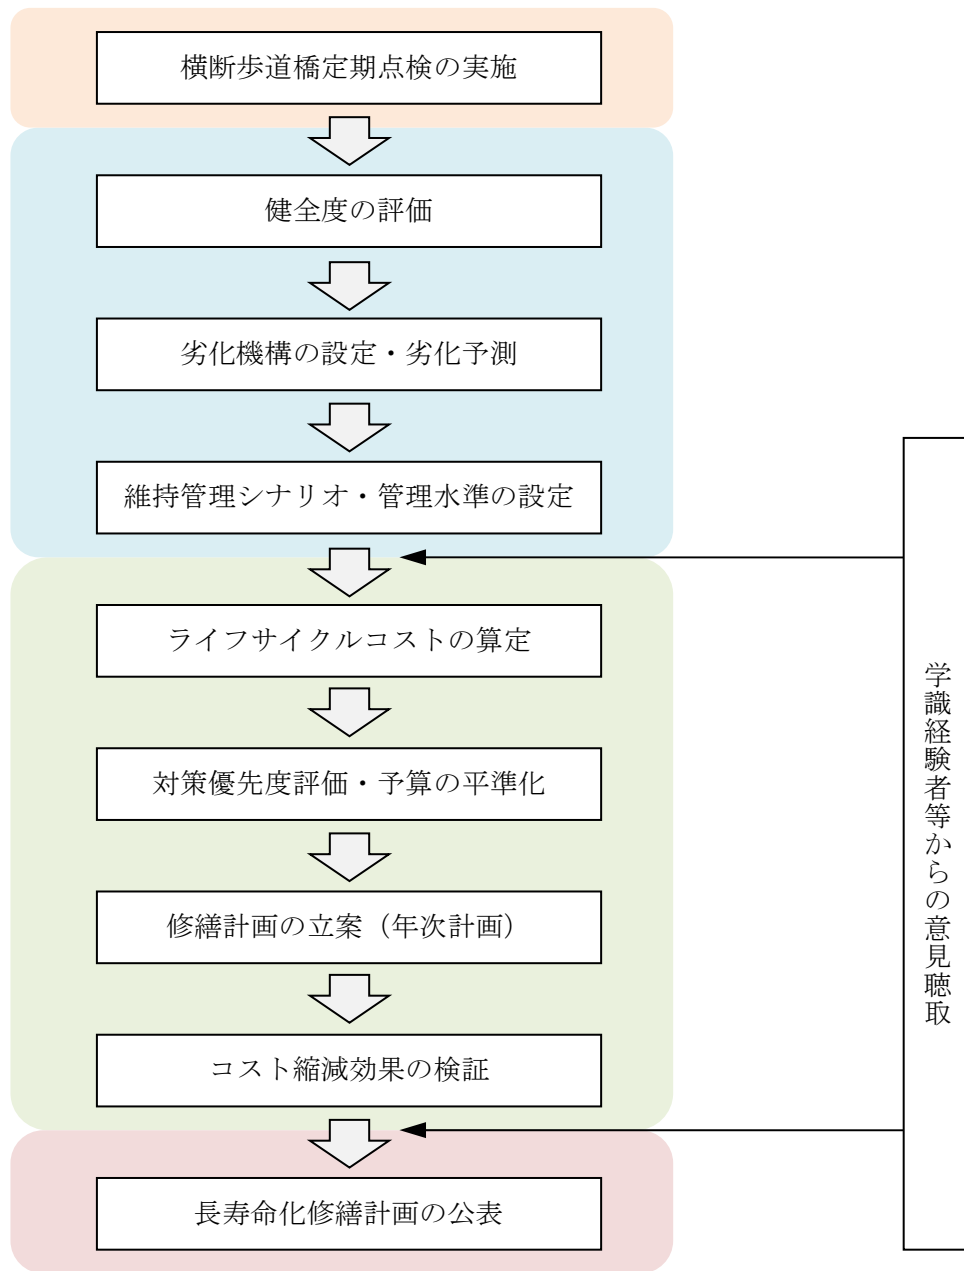


図 4.1 長寿命化修繕計画策定のフロー

5. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握に関する基本的な方針

計画的かつ予防的な維持管理を行っていくためには、横断歩道橋の損傷状況を確認し、健全度を把握することが重要となります。

そのため、「橋梁定期点検要領（国土交通省 道路局 国道・防災課）」（以下、「定期点検要領」という。）に基づき、5年に1回の頻度で定期点検を実施し、横断歩道橋の損傷状況を早期に把握します。また、定期点検の結果に基づく診断結果（健全度）を長寿命化修繕計画に反映させていきます。



写真 5.1 定期点検状況

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

横断歩道橋を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロールや清掃などを継続的に実施していきます。比較的対応が容易な損傷については、日常の維持作業により措置します。

また、地震・台風・豪雨・火災等の災害や予期せぬ大きな事故が発生した場合、若しくはその恐れがある場合や予期せぬ異常が発見された場合には、異常時点検を実施します。この点検では、主に横断歩道橋の安全性を確認します。



写真 5.2 道路パトロール状況

3) 横断歩道橋の健全度

2022年に実施した定期点検結果を踏まえて評価した横断歩道橋の健全度は次のとおりです。

- 橋としての健全度（横断歩道橋単位）は、Ⅰが1橋、Ⅱが1橋、Ⅲが3橋あり、比較的健全度の高い横断歩道橋の割合が高い傾向にあります。
- 早期に措置を講じることが望ましい（健全度Ⅲ）と判定された横断歩道橋は2橋ありました。

【健全度の判定区分】

区分		定義
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

表 5.1 健全度の判定区分

【損傷事例写真】

上部構造（鋼橋）

健全度Ⅱ	健全度Ⅱ	健全度Ⅱ
		
主桁（階段）：腐食,変形・欠損	主桁（階段）：腐食	主桁：腐食

下部構造

健全度Ⅱ	健全度Ⅱ
	
橋脚：ひびわれ	橋脚：ひびわれ

支承部、その他

健全度Ⅲ	健全度Ⅲ	健全度Ⅱ
		
照明施設：腐食,変形・欠損	地覆、高欄：腐食,変形・欠損	支承：腐食

6. 横断歩道橋の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

維持管理方法を従来の「事後保全型」から、計画的かつ予防的な対応を実施する「予防保全型」に移行することで、横断歩道橋の健全度を良好な状態に維持し長寿命化すると共に、架替えに係る費用を抑え、ライフサイクルコスト（LCC）の縮減を図ります。

横断歩道橋の長寿命化にあたっては、耐震化等の対策を修繕工事に併せて実施することにより、大規模地震が発生した場合でも、落橋を防止できる耐震性能も確保し、継続的な安全性と信頼性を確保します。

表 6.1 維持管理方法

管理方法		内 容
従来型	事後保全型	安全に係る問題が深刻化する段階まで、対策を行わないため、損傷が大きくなった時点で架替えを行う。一時的に大きな費用が発生し、通行止めや迂回路等による経済損失も発生する。
本計画	予防保全型	定期的に点検を行い、発生する損傷や劣化を早期に把握し、事故や大規模修繕等に至る前の比較的軽微な段階で対策を行うことにより、安全性・耐久性を長期的に確保する。

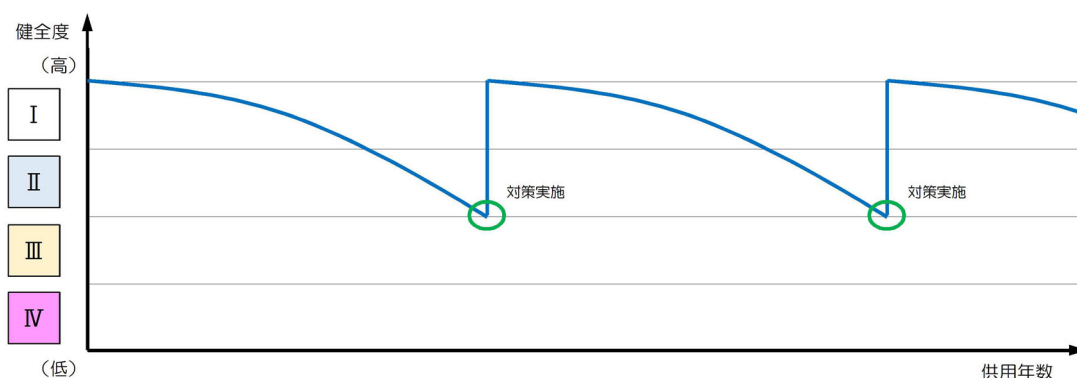


図 6.1 本計画の対策シナリオイメージ

7. 横断歩道橋ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

1) 点検時期

長寿命化修繕計画で対象とした6橋全てについて、横断歩道橋の健全度を把握するため、定期点検要領に基づき、5年に1回の頻度で近接目視による定期点検を実施します。

なお、対象の6橋を2つのグループに分け、毎年1グループ単位で定期点検を行い、2箇年で一巡するように実施していきます。

2) 横断歩道橋の修繕内容及び時期

定期点検により把握した損傷状況から、今後どのように横断歩道橋が傷んでいくかを予測し、適切な修繕内容・実施時期について計画を行いました。今後はこの計画に基づいて修繕を実施していきます。

今後10年間の概ねの点検時期及び修繕実施時期を、後頁に添付した「表7.1 修繕計画表(10年間)」に示します。

なお、今後、維持管理に関するPDCAサイクルの中で、点検結果や補修実績等を蓄積し、継続的に計画を見直すことにより、計画の精度向上を図っていきます。

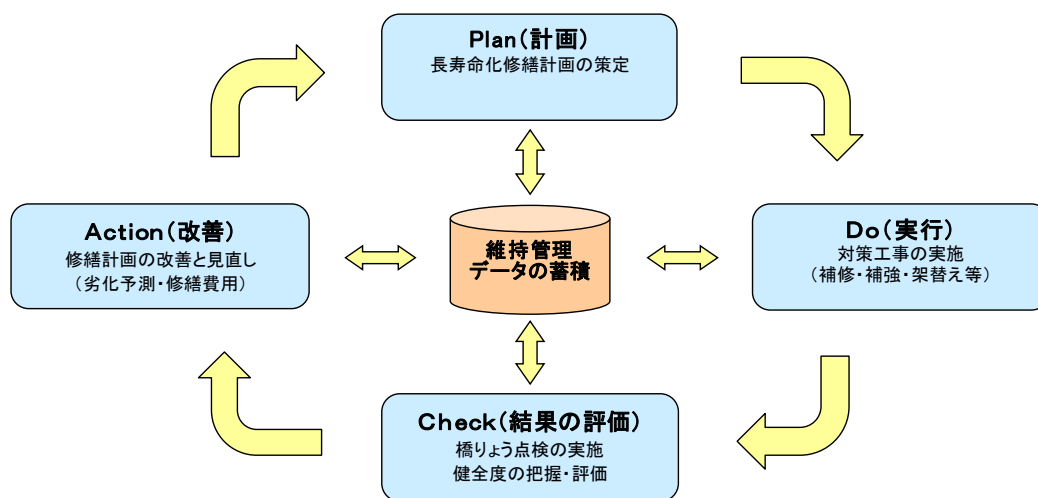


図7.1 PDCAサイクル

8. 長寿命化修繕計画による効果

横断歩道橋長寿命化修繕計画策定による事業効果を検証するため、「事後保全型」と「予防保全型」の維持管理シナリオについて今後 50 年間に必要とされる維持管理コストの比較を行いました。

その結果、「事後保全型」の維持管理から、「予防保全型」の維持管理に移行することで、維持管理に係る事業費の大幅な縮減効果があることが確認できました。(図 8.1 参照)

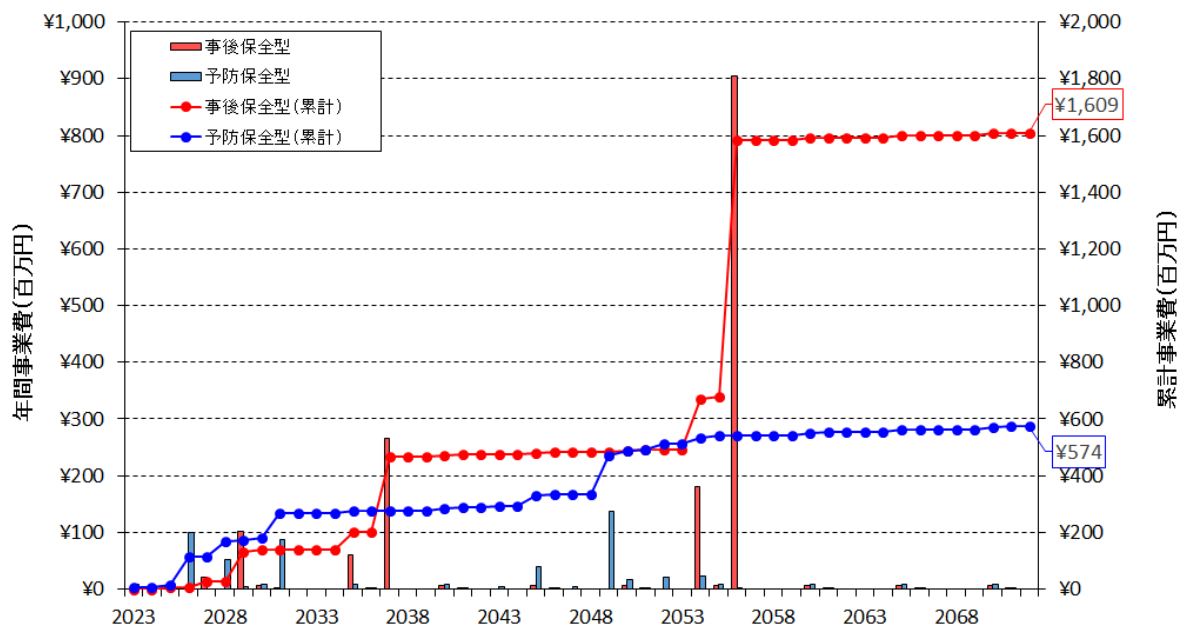


図 8.1 事業費の比較

- (1) 事後保全型管理の事業費 ----- 50年間総事業費 約 16 億円
- (2) 予防保全型管理の事業費 ----- 50年間総事業費 約 6 億円

コスト縮減効果 16 億円 - 6 億円 = 10 億円 (約 2,000 万円/年)

※費用には、工事費の他、設計費、定期点検費も含まれます。
 ※市川駅南口ペデストリアンデッキは除く。

9. 今後の取り組み

1) 新技術等の活用方針

横断歩道橋の定期点検および修繕のさらなる効率化のため、市では新技術の積極的な活用を行っていきます。

市が管理する全ての横断歩道橋に対して新技術の活用を含めた比較検討を行い、新技術を用いた点検および修繕の実施を目指しますが、現行の新技術では費用縮減効果が見込まれなかった為、今後も新技術の活用検討を積極的に行い、従来工法と同等以上の効果が得られる技術が開発されることを見込み、今後10年間で80万円の縮減を目標とします。

2) 費用縮減効果に関する具体的な方針

今後の維持管理に係る費用縮減の方針として、「事後保全型」から、「予防保全型」の管理に切り替えることで、50年間で約2,000万円のコスト縮減を目指します。

市川市の架かる横断歩道橋は、京葉道路および交通量の多い主要道路（1級、2級）を跨いでおり、近接した箇所に類似の施設もないことから、利用者の安全面等を考慮すると現時点での撤去・集約化が現実的ではありませんが、施設の必要性について検証するとともに、今後10年間で1橋程度の撤去を検討し、撤去による事業費の削減目標を4,100万円とします。

撤去の基本方針等

(1) 撤去の基本方針

- ・利用者が少ないか否か
- ・老朽化し危険であるか否か
- ・近傍に横断歩道が設置されていること。又は設置ができるか否か
- ・警察、近隣町内会、学校関係など関係者間の合意形成がなされているか否か

(2) その他検討要素

- ・市民からの要望があるか否か
- ・通学路指定の有無
- ・道路車線数
- ・12時間における道路交通量

ただし、撤去実施の最終決定は、警察、近隣町内会、学校関係など関係者間の合意形成が図られなければ実施しません。

10. 計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者

1) 計画策定担当部署

市川市 道路交通部 道路安全課
TEL 047-712-6351 (直通)

2) 意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

横断歩道橋長寿命化修繕計画策定にあたり、以下の学識経験者の方に貴重なご意見をいただき、計画に反映いたしました。

芝浦工業大学 工学部 土木工学科 勝木 太 教授



写真 10.1 意見聴取の状況

市川市管理道路付属物一覧表

整理番号	台帳番号	構造物諸元					定期点検結果		補修対策内容				点検・対策工事予定年表(2024年～2033年)										
		施設名称	路線名	架設年 (西暦年) 度	延長 (m)	幅員 (m)	構造形式	点検年	点検 次回 年	内容	主な工種	着手 予定年度	完了 予定年度	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)
1	17	鬼高・田尻歩道橋	市道6117号	2015	56.89	4.00	I桁(鋼床版)	2022	2026	補修	塗装塗替工	2046年	2046年			○						○	
2	19	鬼高歩道橋(田尻3丁目)	市道6114号	1971	36.40	2.95	I桁(デッキプレート床版)	2022	2026	補修	塗装塗替工	2032年	2032年			○						○	●
3	21	二俣歩道橋	市道7012号	1996	43.40	3.10	I桁(デッキプレート床版)	2022	2026	補修	塗装塗替工	2050年	2050年			○						○	
4	110	塩浜歩道橋	市道0101号	1981	26.80	1.90	I桁(デッキプレート床版)	2022	2027	耐震・補修	耐震補強工・塗装塗替工	2029年	2029年				○		●				○
5	111	原木・二俣歩道橋	市道0116号	(1994)	35.60	1.74	箱桁(鋼床版)	2022	2026	補修	塗装塗替工	2026年	2026年			●	○						○
6		市川駅南口ペDESTリアンデッキ	市道0216号	(2010)	68.00	2F:6.45 3F:12.0	上落式4径間ラーメン橋	-	2026	-	-	-	-			○						○	

※塩浜歩道橋の直近の補修費は、耐震補強費も含める。

※ ○ : 定期点検
● : 補修工事
